

thermondo GmbH | Prinzenstraße 34 | 10969 Berlin

Auftraggeber/in

Ulrich Pickardt
Im Semmichbache 16
99334 Amt Wachsenburg

Objekt

Im Semmichbache 16
99334 Amt Wachsenburg

Berlin, 04.03.2026

Interner Installationsplan

Die technische Planung des Bauvorhabens ist abgeschlossen. Der interne Installationsplan enthält alle wichtigen Parameter und grafische Darstellungen der zu installierenden Hauptkomponenten.


Technische Planung

Auslegung

Norm-Gebäudeheizlast	7,10 kW
Normaußentemperatur	-13,20 °C
Temperatur am Bivalenzpunkt	-6,00 °C
Zu verbauende kW Klasse	7 kW
Hersteller	Buderus
Kältemittel	R290

Aufstellort

Aufstellort Wärmepumpe

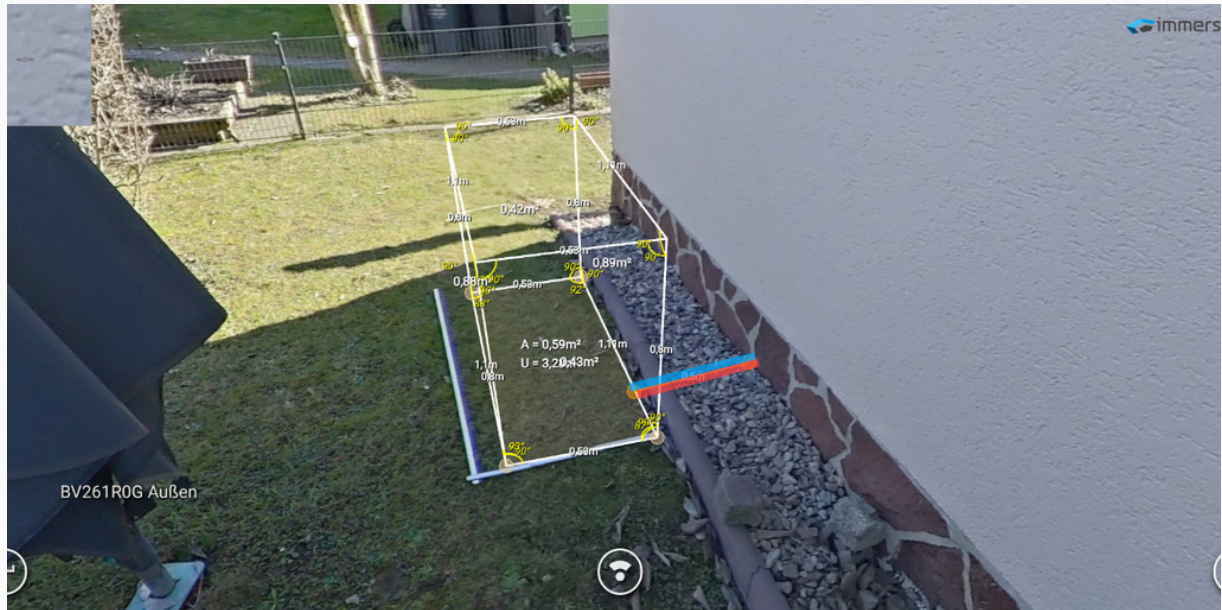

Fundamentart	Klassik
Aushubreste	Entsorgen durch thermondo
Schutzbereichherstellung für Propan mittels Rasenkantenstein	Nein
Anfahrerschutz notwendig	Nicht notwendig
TA-Lärm eingehalten	Ja
Baurecht eingehalten	Ja
Tragehilfe benötigt	Nein
Gerüst oder Hebebühne für Heizungsinstallation	Nicht notwendig
Hauseinführung	Unterirdisch
Hauseinführung zu Außeneinheit: Entfernung	1,00 m
Hauseinführung zu Außeneinheit: Leitungsführung	Unterirdisch mit Schachtung
Abdeckhaube Buderus	Nicht verbauen
Hauseinführung zu Außeneinheit: Oberfläche	Unversiegelt
Länge benötigtes Wellrohr	5,00 m

Aufstellort

Hauseinführung innen



Bestand

Aktueller Energieträger	Erdgas
Typenbezeichnung Bestandanlage	NeueHarzerWerke, Typenschild vorhanden

Bestand

Jahr der Inbetriebnahme der alten Heizanlage	1998
Professionelle Entsorgung der Bestandsanlage	Durch thermondo mit normalen Aufwand
Rückbau alter Gasleitung	Ja
Gaszählernummer	1040059298
Gaszählerstand in m ³	47394.218
Solarthermie vorhanden	Nein
Warmwasserbereitung über Heizungsanlage	Ja
Zirkulationsleitung vorhanden	Ja, Zirkulationspumpe installieren
Druckminderer vorhanden	Ja
Kondensatpumpe notwendig	Nein

Heizkreise


Anzahl Heizkreise für Heizkörper	1
Anzahl Heizkreise für Fußbodenheizung	0
Einrohr- oder Zweirohrsystem	Zweirohrsystem
Anzahl Heizkörper	12
Anzahl Heizschlaufen	0
Anzahl der zu tauschenden Heizkörper	0

Hydraulik

Systemtrennung verbauen	Nein
Zuwegung und Einbringung ausreichend	Ja
Platz für verkaufte Hydraulik	Ja
Hydraulikschema	Buderus WLW 186i AR 4-7kW TP70, Trinkwasserspeicher, 1 Heizkreis-Hydraulikschema
Inneneinheit Buderus	TP70
Etage neues Heizsystem	Keller
Warmwasserspeicher extern	200 l

Hydraulik

Aufstellort neues Heizsystem

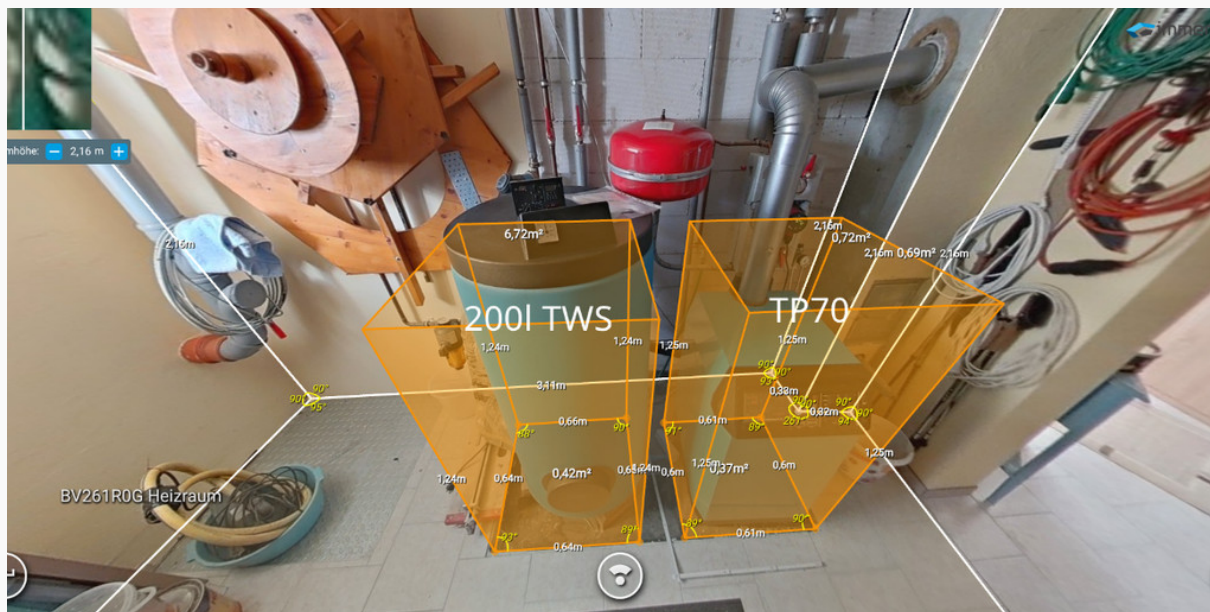

Anzahl der zu verbauenden Wärmemengenzähler	0
Trinkwasserenthärtung	Nicht vorgesehen
Entsalzungspatrone	Vollentsalzungspatrone installieren
Anzahl der zu verbauenden Wohnungswasserzähler warm	0
Anzahl der zu verbauenden Wohnungswasserzähler kalt	0

Verrohrung

Anzahl Deckendurchbrüche	0
Anzahl Wanddurchbrüche	0
Rohrlänge Hauseinführung - Inneneinheit	4,00 m
Länge zusätzlicher Verrohrung innen	0,00 m

Elektrische Planung

Hausanschlusskasten

Hausanschlusskasten ausreichend	Ausreichend
Aufstellort des Hausanschlusskasten	Im Keller
HAK Potentialausgleich vorhanden	Nein

PV-Anlage

PV-Anlage vorhanden	Keine PV-Anlage
---------------------	-----------------

Zusatzgeräte

Wallbox vorhanden	Nein
Elektrospeicher vorhanden	Nein
Durchlauferhitzer vorhanden	Nein
Klimageräte vorhanden	Nein

Stromtarif & Tarifschaltgerät

Stromtarif für Wärmepumpe nach §14a	Modul 1 (Hausstrom)
Netzbetreiber	TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG
Netzbetreiber - Bemerkung	x
Ausführung Tarifschaltgerät (TSG)	TSG nicht notwendig, intelligentes Messsystem vorbereiten

Zählerschrank: Allgemein

Zählerschrank ausreichend	Technisch ausreichend
Ausführung des Bestandshauptzählers ausreichend	Ausreichend (3-Punkt Befestigung)
Anzahl der Zähler	2
Zählernummer Hauptzähler	1 EFR24 6547 2580

Zählerschrank: Allgemein

Zählernummer 2	x
Zählerzusammenlegung	Nein

Zählerschrankplan



■ Versicherung Steuerschrank
 ■ Energieflusssensor

Zählerschrank: Ertüchtigung

Zählervorsicherung ausreichend	Selektiver Leitungsschutzschalter (SLS) ausreichend
Bemessungsstrom Zählervorsicherung	35,00 A
Überspannungsschutz vorhanden	Nein

Potentialausgleich

Potentialausgleich ausreichend	Nicht ausreichend
Ausführung Potentialausgleich	Schiene vorhanden, Tiefenerder setzen

HEMS



Internetverbindung für t-smart	Powerline installieren
LAN-Buchse für HEMS frei	Ja
Steckdose nahe dem Router	Steckdose nahe dem Router freizuräumen

Kabelwege


Hausanschlusskasten zum Zählerschrank: Erneuerung der Hauptleitungen	Nicht notwendig
Zählerschrank zum Steuerschrank: Leitungslänge	13,00 m
Zählerschrank zum Steuerschrank: Anzahl Wanddurchbrüche	1
Zählerschrank zum Steuerschrank: Anzahl Deckendurchbrüche	0
Leitungslänge Steuerschrank zu Wärmepumpe oder Inneneinheit	7,00 m
Leitungslänge Steuerschrank - Backup Heater	7,00 m
Leitungsverlegung durch ein Badezimmer	Nein

Kabelwege

Kabelwege

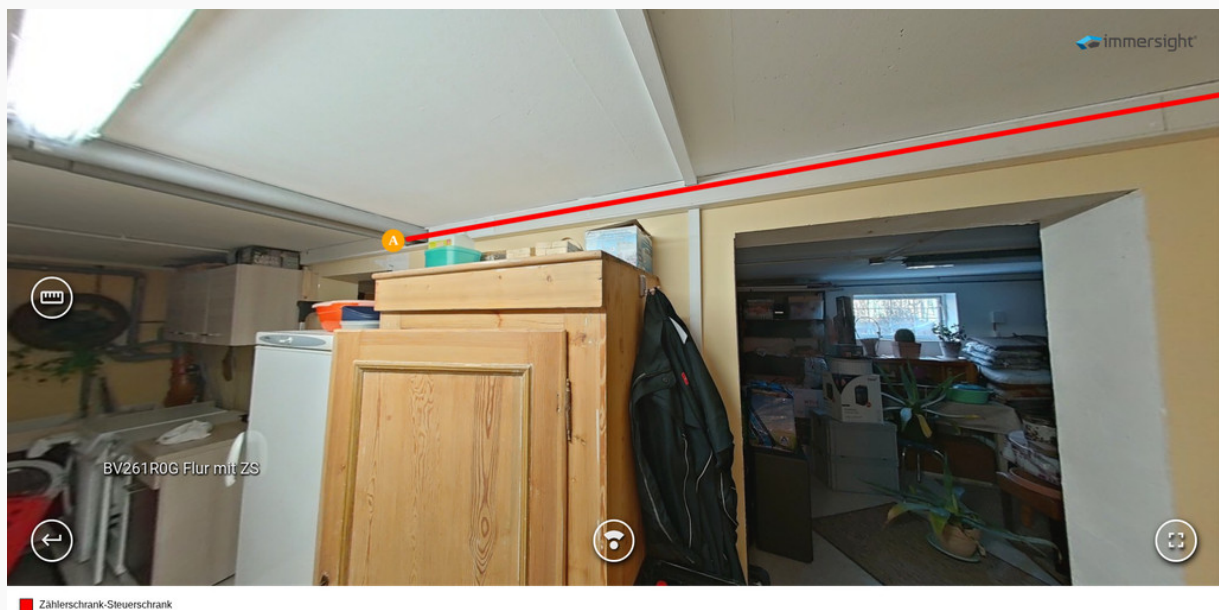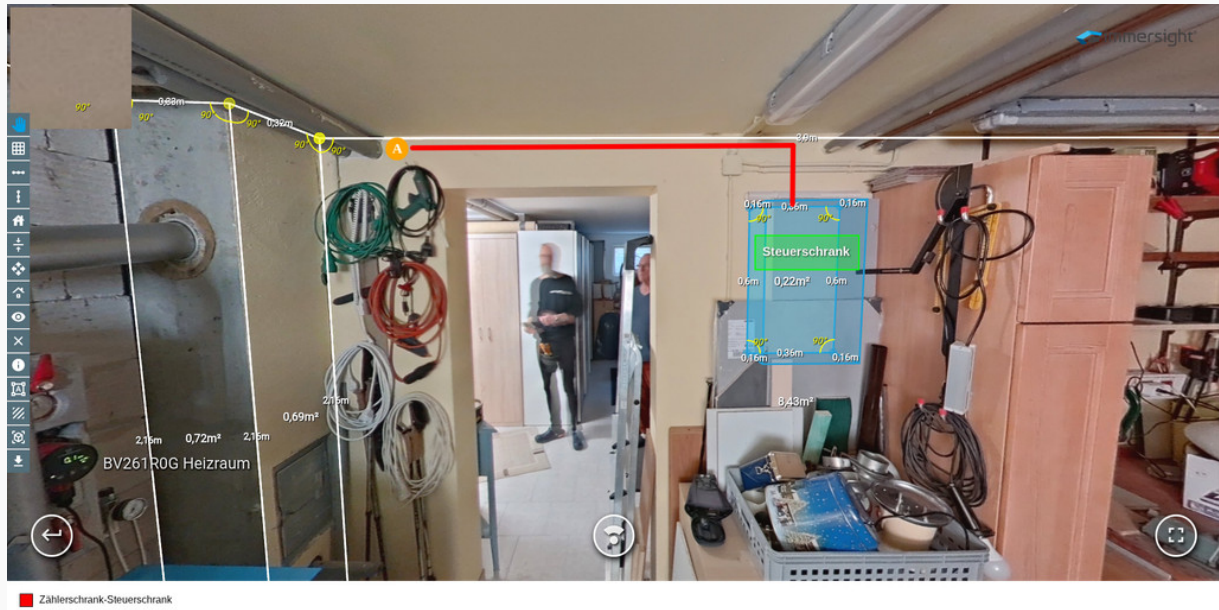

Kabelwege

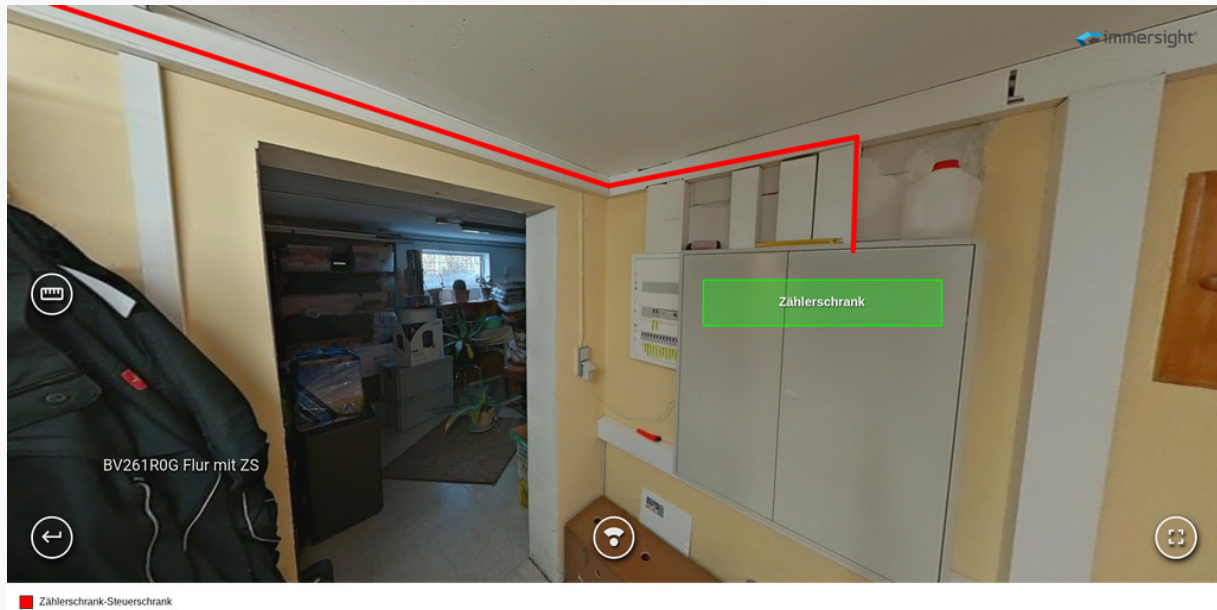

Heizungsdemontage für Elektroinstallation notwendig

Nein

Aufstellort Steuerschrank Wärmepumpe



Öltankentsorgung für Elektroinstallation	Nicht notwendig vor Elektroinstallation
Gerüst notwendig für Elektroinstallation	Nein
